

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE DE AVANCE DE OBRA 2024

#	N° CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-5-01-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).	\$2,000,000.00	100.00%	100.00%
2	AIZT-DGODU-LP-L-0-02-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).	\$37,977,538.41	100.00%	100.00%
3	AIZT-DGODU-AD-L-5-03-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).	\$250,000.00	100.00%	100.00%
4	AIZT-DGODU-LP-L-0-04-2024	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).	\$4,999,091.19	100.00%	100.00%
5	AIZT-DGODU-AD-L-5-05-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO, APLANADO Y NIVELACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).	\$463,125.00	100.00%	100.00%
6	AIZT-DGODU-LP-L-0-06-2024	TRABAJOS DE BACHEO, APLANADO Y NIVELACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).	\$9,250,947.38	100.00%	100.00%
7	AIZT-DGODU-LP-L-0-07-2024	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: INPI PICOS (06-013) Y VIADUCTO PIEDAD (06-038); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$3,148,405.99	100.00%	100.00%
8	AIZT-DGODU-LP-L-0-08-2024	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y BANQUETAS, GUARNICIONES Y COLADERAS: CUCHILLA RAMOS MILLÁN (06-007), MOSCO CHINAMPA (06-020), SAN MIGUEL (BARR) (06-030), CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II (06-049), RAMOS MILLÁN BRAMADERO II (06-062) Y JUVENTINO ROSAS I (06-054); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$10,474,223.99	100.00%	100.00%
9	AIZT-DGODU-LP-L-0-09-2024	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE: NUEVA STA ANITA (06-021), PICOS IZTACALCO 1A (06-023) Y, TLAZINTLA (06-037); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$3,470,376.00	100.00%	100.00%
10	AIZT-DGODU-LP-L-0-10-2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES: SAN FCO XICALTONGO (BARR) (06-029) Y, SANTIAGO NORTE (BARR) (06-034); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$2,469,435.99	100.00%	100.00%
11	AIZT-DGODU-LP-L-0-11-2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES: SANTIAGO SUR (BARR) (06-035) Y; REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO: SANTA CRUZ (BARR) (06-033); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$2,785,510.99	100.00%	100.00%
12	AIZT-DGODU-LP-L-0-12-2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES: JUVENTINO ROSAS II (06-055) Y; REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO: TLACOTAL RAMOS MILLÁN (06-036); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$3,539,029.99	100.00%	100.00%

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE DE AVANCE DE OBRA 2024

#	N° CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL
13	AIZT-DGODU-LP-L O-13-2024	TRABAJOS DE BACHEO, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$5,021,631.24	100.00%	100.00%
14	AIZT-DGODU-AD- L-S-14-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE: AV. HIDALGO, LA CRUZ COYUYA Y EN COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$737,500.00	100.00%	100.00%
15	AIZT-DGODU-LP-L O-15-2024	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE: AV. HIDALGO, LA CRUZ COYUYA; EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$3,877,583.13	100.00%	100.00%
16	AIZT-DGODU-LP-L O-16-2024	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$10,870,143.78	100.00%	100.00%
17	AIZT-DGODU-LP-L O-17-2024	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAIS).	\$15,135,386.22	100.00%	100.00%
18	AIZT-DGODU-AD- L-S-18-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO (CON RECURSOS DEL FAIS) EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$914,886.44	100.00%	100.00%
19	AIZT-DGODU-LP-L O-19-2024	REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAIS).	\$31,411,100.99	100.00%	100.00%
20	AIZT-DGODU-AD- L-S-20-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$755,329.64	100.00%	100.00%
21	AIZT-DGODU-LP-L O-21-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$14,244,670.36	100.00%	100.00%
22	AIZT-DGODU-AD- L-S-22-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$502,918.81	100.00%	100.00%
23	AIZT-DGODU-LP-L O-23-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$9,497,081.19	100.00%	100.00%
24	AIZT-DGODU-AD- L-S-24-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$756,707.92	100.00%	100.00%
25	AIZT-DGODU-LP-L O-25-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$14,243,292.07	100.00%	100.00%
26	AIZT-DGODU-LP-L O-26-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS: CENTRO SOCIAL JOSEFINA DÍAZ EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$4,452,800.19	100.00%	100.00%
27	AIZT-DGODU-AD- L-S-27-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$180,000.00	100.00%	100.00%

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE DE AVANCE DE OBRA 2024

#	N° CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL
28	AIZT-DGODU-LP-L O-28-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$4,561,349.10	100.00%	100.00%
29	AIZT-DGODU-LP-L O-29-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$2,642,074.57	100.00%	100.00%
30	AIZT-DGODU-AD- L-S-30-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO Y; REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$464,102.63	100.00%	100.00%
31	AIZT-DGODU-LP-L O-31-2024	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO EN COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$4,742,193.75	100.00%	100.00%
32	AIZT-DGODU-AD- L-S-32-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$762,952.23	100.00%	100.00%
33	AIZT-DGODU-AD- L-O-33-2024	REHABILITACIÓN DE INMUEBLES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$15,259,044.61	100.00%	100.00%
34	AIZT-DGODU-AD- L-O-34-2024	REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$2,290,757.99	100.00%	100.00%
35	AIZT-DGODU-AD- L-O-35-2024	REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$1,838,622.93	100.00%	100.00%
36	AIZT-DGODU-AD- L-S-36-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$1,123,768.79	100.00%	100.00%
37	AIZT-DGODU-AD- L-O-37-2024	REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$22,475,376.04	100.00%	100.00%
38	AIZT-DGODU-AD- L-S-38-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$423,907.98	100.00%	100.00%
39	AIZT-DGODU-AD- L-O-39-2024	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$8,478,159.64	100.00%	100.00%
40	AIZT-DGODU-AD- L-S-40-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN LA CRUZ COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$395,583.77	100.00%	100.00%
41	AIZT-DGODU-AD- L-O-41-2024	MANTENIMIENTO DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN LA CRUZ COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$7,911,675.44	100.00%	100.00%
42	AIZT-DGODU-AD- L-S-42-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVERO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$683,341.35	100.00%	100.00%


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE DE AVANCE DE OBRA 2024

#	Nº CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL
43	AIZT-DGODU-AD-L-O-43-2024	REHABILITACIÓN DE VIVERO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$13,666,827.04	100.00%	100.00%
44	AIZT-DGODU-AD-L-O-44-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO SOCIAL Y DEPORTIVO FORTALEZA (2DA ETAPA) EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$621,760.00	100.00%	100.00%
45	AIZT-DGODU-AD-L-O-45-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO SOCIAL Y DEPORTIVO FORTALEZA (2DA ETAPA) EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$2,066,104.11	100.00%	100.00%

\$283,836,318.88



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ
J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-S-01-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).	\$2,000,000.00	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-02-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).	\$37,977,538.41	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-03-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).	\$250,000.00	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-04-2024	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).}	\$4,999,091.19	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ

31/12/2024

M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PERALTA

31/12/2024

ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-05-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO, APLANADO Y NIVELACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).	\$463,125.00	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ

31/12/2024

M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PERALTA

31/12/2024

ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-06-2024	TRABAJS DE BACHEO, APLANADO Y NIVELACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).	\$9,250,947.38	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ

31/12/2024

M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PERALTA

31/12/2024

ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-07-2024	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: INPI PICOS (06-013) Y VIADUCTO PIEDAD (06-038); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$3,148,405.99	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PERALTA


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-08-2024	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y BANQUETAS, GUARNICIONES Y COLADERAS: CUCHILLA RAMOS MILLÁN (06-007), MOSCO CHINAMPA (06-020), SAN MIGUEL (BARR) (06-030), CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II (06-049), RAMOS MILLÁN BRAMADERO II (06-062) Y, JUVENTINO ROSAS I (06-054); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$10,474,223.99	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ

31/12/2024


SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-09-2024	REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE: NUEVA STA ANITA (06-021), PICOS IZTACALCO 1A (06-023) Y, TLAZINTLA (06-037); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$3,470,376.00	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-10-2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES: SAN FCO XICALTONGO (BARR) (06-029) Y, SANTIAGO NORTE (BARR) (06-034); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$2,469,435.99	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-11-2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES: SANTIAGO SUR (BARR) (06-035) Y; REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO: SANTA CRUZ (BARR) (06-033); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$2,785,510.99	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CNÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-12-2024	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES: JUVENTINO ROSAS II (06-055) Y; REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO: TLACOTAL RAMOS MILLÁN (06-036); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).	\$3,539,029.99	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-13-2024	TRABAJOS DE BACHEO, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$5,021,631.24	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-14-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE: AV. HIDALGO, LA CRUZ COYUYA Y EN COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$737,500.00	100.00%


J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-15-2024	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE: AV. HIDALGO, LA CRUZ COYUYA; EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$3,877,583.13	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-16-2024	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$10,870,143.78	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-17-2024	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAIS).	\$15,135,386.22	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-18-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO (CON RECURSOS DEL FAIS) EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$914,886.44	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-19-2024	REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAIS).	\$31,411,100.99	100.00%


J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ

31/12/2024


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PERALTA

31/12/2024


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-20-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$755,329.64	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-21-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$14,244,670.36	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARG. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-22-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$502,918.81	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-23-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$9,497,081.19	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-24-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$756,707.92	100.00%


J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-25-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$14,243,292.07	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ

31/12/2024


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PERALTA

31/12/2024


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-26-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS: CENTRO SOCIAL JOSEFINA DÍAZ EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$4,452,800.19	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-27-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$180,000.00	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-28-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$4,561,349.10	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-29-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$2,642,074.57	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ

31/12/2024


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PÉRALTA

31/12/2024


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-30-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO Y; REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$464,102.63	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ

31/12/2024


SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-LP-L-O-31-2024	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO EN COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$4,742,193.75	100.00%


J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ

31/12/2024


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PERALTA

31/12/2024


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-32-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$762,952.23	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-O-33-2024	REHABILITACIÓN DE INMUEBLES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$15,259,044.61	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS




ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PÉRALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-O-34-2024	REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$2,290,757.99	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-O-35-2024	REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$1,838,622.93	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PÉRALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-36-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$1,123,768.79	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS




ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-O-37-2024	REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$22,475,376.04	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-38-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$423,907.98	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-O-39-2024	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$8,478,159.64	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ
31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-40-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN LA CRUZ COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$395,583.77	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO


M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO


ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-O-41-2024	MANTENIMIENTO DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN LA CRUZ COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$7,911,675.44	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-S-42-2024	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVERO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$683,341.35	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-O-43-2024	REHABILITACIÓN DE VIVERO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).	\$13,666,827.04	100.00%


J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-O-44-2024	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO SOCIAL Y DEPORTIVO FORTALEZA (2DA ETAPA) EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$621,760.00	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024


SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


31/12/2024

REPORTE GENERAL DE BITÁCORA DE AVANCE DE OBRA 2024

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

obs	No. CONTRATO	TRABAJOS	IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE REAL
1	AIZT-DGODU-AD-L-O-45-2024	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO SEDE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.	\$2,066,104.11	100.00%

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



ARQ. CÉSAR ABRAHAM CHÁVEZ
MARTÍNEZ

31/12/2024


SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



M.A.C. AZUCENA GISEL CRUZ
PERALTA

31/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

31/12/2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACCIONES REALIZADAS: EL PROYECTO QUE SE EJECUTA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS, CONSTA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 719.87 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA.

EN LAS COLONIAS: CARLOS ZAPATA VELA Y GRANJAS MÉXICO

POBLACIÓN BENEFICIADA: 986 HABITANTES

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 87,339,841.42

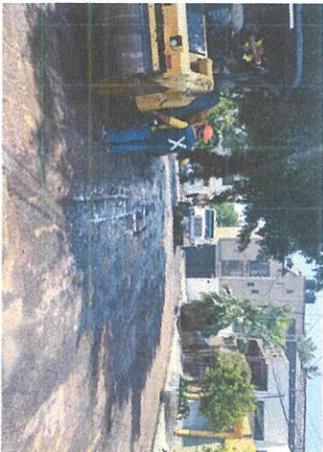



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.


TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACCIONES REALIZADAS: EL PROYECTO QUE SE EJECUTA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS, CONSTA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 170.62 ML DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y PUVIALES, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.

EN LAS COLONIAS: AGRÍCOLA PANTITLÁN, CARLOS ZAPATA VELA, GRANJAS MÉXICO Y LA CRUZ COYUYA.

POBLACIÓN BENEFICIADA: 682 HABITANTES

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 36,436,000.02

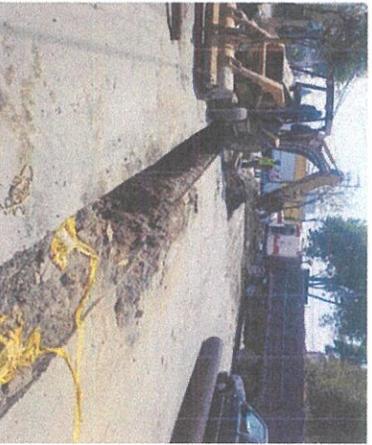



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL SUSEJO




REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACCIONES REALIZADAS: EL PROYECTO QUE SE EJECUTA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS, CONSTA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE **168.84 M2** DE BANQUETA Y **84.43 ML** DE GUARNICIÓN.

EN LAS COLONIAS: AGRÍCOLA ORIENTAL, AGRÍCOLA PANTITLÁN, BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO, BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO SANTIAGO NORTE, BARRIO SANTIAGO SUR, CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE, GABRIEL RAMOS MILLÁN, JUVENTINO ROSAS Y MILITAR MARTE.

POBLACIÓN BENEFICIADA: 591 HABITANTES

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 17,768,970.96

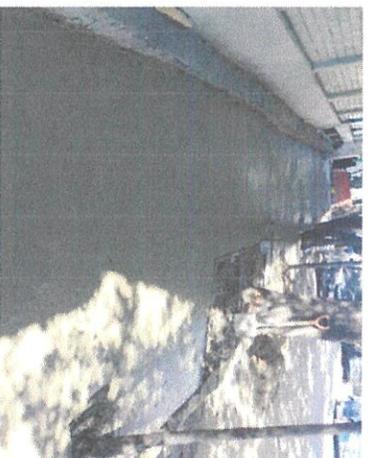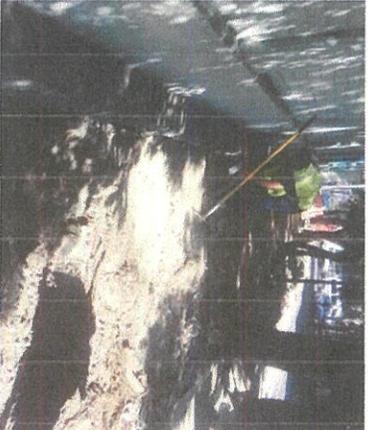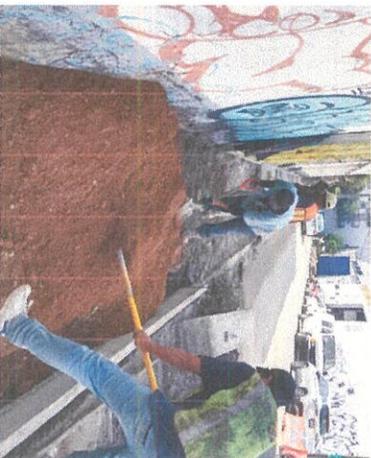



Gobierno de la
Ciudad de México

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACCIONES REALIZADAS: EL PROYECTO QUE SE EJECUTA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS, CONSTA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS.

- 1.- **JARDÍN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON, UBICADO EN CALLE COMUNAL N° 43, C.P. 08100, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN.**
APLICACIÓN DE PINTURA, APLICACIÓN DE BARNIZ, COLOCACIÓN DE LOSETA, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, DESYERBE Y PROTECCIONES DE HERRERÍA.
- 2.- **ESCUELA PRIMARIA TONALAMATL, UBICADA EN CALLE SUR 111 A, COLONIA JUVENTINO ROSAS.**
SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE REJILLA, COLOCACIÓN DE LOSETA
REHABILITACIÓN DE DRENAJE, COLOCACIÓN DE TABLEROS DE BÁSQUET BOL.
- 3.- **ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT, UBICADA EN VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS N° 29, COLONIA CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE.**
APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PUERTA HERRERÍA, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, COLOCACIÓN DE LOSETA
DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUSTITUCIÓN DE MAMPARAS EN BAÑOS.
- 4.- **ESCUELA PRIMARIA LUIS CHÁVEZ OROZCO, UBICADA EN SUR 163 N° 1910 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 112, COLONIA BRAMADERO GABRIEL RAMOS MILLÁN.**
APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS.
- 5.- **ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 59 RENÉ CASSIN, UBICADA EN CALLE ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ N° 4433, COLONIA VIADUCTO PIEDAD.**
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA VELARÍA, COLOCACIÓN DE VELARÍA.
- 6.- **ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA, UBICADA EN CALLE ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ N° 4433, COLONIA VIADUCTO PIEDAD.**
REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA, MONTAJE DE ESTRUCTURA Y COLOCACIÓN DE
MEMBRANA ARQUITECTÓNICA.

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,440 USUARIOS

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 21,652,950.34




**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS**



**JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO**

**REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

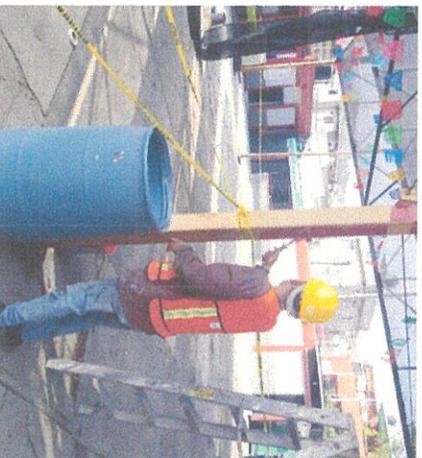




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
TRABAJO REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

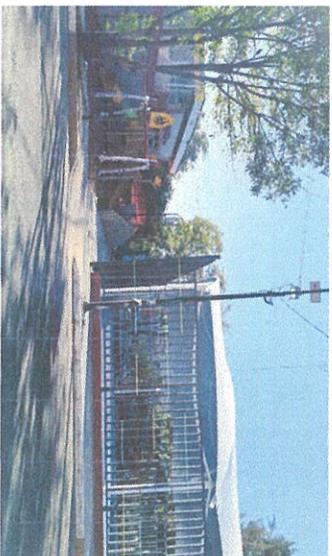



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACCIONES REALIZADAS: EL PROYECTO QUE SE EJECUTA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS, CONSTA DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

- 1.- **CENTRO SOCIAL JOSEFINA DÍAZ, UBICADA EN AVENIDA SANTIAGO 97-A, BARRIO SANTIAGO SUR.**
SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE LOSETA, COLOCACIÓN DE PUERTAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS
COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN, COLOCACIÓN DE ESPEJOS, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y COLOCACIÓN DE LETRERO EN FACHADA PRINCIPAL.
- 2.- **DEPORTIVO COYUYA, UBICADA EN CALZADA COYUYA N° 10, COLONIA LA CRUZ COYUYA.**
COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, COLOCACIÓN DE PORTERÍAS PARA CANCHA, COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICAS PARA CANCHA, APLICACIÓN DE PINTURA, INSTALACIÓN DE JUEGOS, COLOCACIÓN DE TECHUMBRE, COLOCACIÓN DE PISO INFILTRANTE Y RESANE E I MUROS DE CANCHAS.
- 3.- **PARQUE BENITA GALEANA LACUNZA, UBICADA EN CALLE 2 N° 71, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN.**
CONSTRUCCIÓN DE TROTA PISTA, INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL Y COLOCACIÓN DE EJERCITADORES.
- 4.- **CENTRO SOCIAL NUEVO MILENIO, UBICADA EN AVENIDA 4 ORIENTE (RIO CHURUBUSCO) S/N, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN.**
COLOCACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA Y COLOCACIÓN DE RING DE BOXEO.
- 5.- **CENTRO SOCIAL SUR 20, UBICADA EN CALLE SUR 20 N° 533 ENTRE RETORNO 7 Y RETORNO 8, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL.**
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA EN HERRERÍA Y ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.
- 6.- **CENTRO SOCIAL RECREO, UBICADA EN CALLE SUR 115 N° 2300 ENTRE SUR 113B Y SUR 115, COLONIA JUVENTINO ROSAS.**
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA EN HERRERÍA Y ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.
- 7.- **CENTRO SOCIAL TLACOTAL, UBICADA EN AVENIDA 5 N° 2538 ENTRE ORIENTE 100 Y ANDADOR 5, COLONIA TLACOTAL GABRIEL RAMOS MILLÁN.**
APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.
- 8.- **CENTRO SOCIAL ZAPATA VELA, UBICADA EN CALLE LENGUAS INDÍGENAS N° 31 ENTRE SALYULTECA Y AVENIDA RIO CHURUBUSCO, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA**
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA EN HERRERÍA Y ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

- 9.- CASA DE CULTURA INPI PICOS (ABELIAS), UBICADA EN CALLE FEDERICO C. BATING S/N ENTRE ALEJANDRO Y CANAL DE TEZONTLE, COLONIA INPI PICOS.
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA EN HERRERÍA Y ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.
- 10.- CENTRO SOCIAL FRACCIONAMIENTO COYUYA, UBICADA EN CALLE CÓLICA N° 16 ENTRE HIDALGO Y COYUYA, COLONIA FRACCIONAMIENTO COYUYA.
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA EN HERRERÍA Y ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.
- 11.- CENTRO SOCIAL NUEVO MILENIO, UBICADA EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N ENTRE 1RA CERRADA DE RIO CHURUBUSCO Y 2DA CERRADA DE RIK CHURUBUSCO, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN.
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA EN HERRERÍA Y ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.
- 12.- CASA DE CULTURA FORO CULTURAL 2 DE OCTUBRE, UBICADA EN CALLE IGNACIO MARISCAL N° 10 ENTRE GUILLERMO PRIETO Y VALENTÍN GÓMEZ FARIAS COLONIA CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE.
APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.
- 13.- CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO SAN PEDRO, UBICADA EN AVENIDA AMACUZAC S/N ENTRE JESÚS URUETA Y SANTIAGO RAMON Y CAJAL, BARRIO SAN PEDRO.
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA EN HERRERÍA Y ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.
- 14.- CENTRO SOCIAL LEANDRO VALLE, UBICADA EN CALLE JAVIER S/N ENTRE SUR 8 Y SUR 12, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL.
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA EN HERRERÍA Y ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.
- 15.- CENTRO SOCIAL ELENA GARRO, UBICADA EN CALLE DOS N° 177 ENTRE EDUARDO MOLINA Y AVENIDA XOCHIMILCO, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL.
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA EN HERRERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.
- 16.- CENTRO SOCIAL FLAMINGOS, UBICADA EN CALLE FLAMINGOS S/N ENTRE PLAYA TECOLOLTLA Y PLAYA CORTES, COLONIA MILITAR MARTE.
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA EN ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.
- 17.- CENTRO SOCIAL GRANJAS MÉXICO, UBICADA EN CALLE CHICLE S/N ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE CANELA, COLONIA GRANJAS MÉXICO.
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA EN ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL RUESCO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

18.- CANCHA DE BASQUETBOL Y ÁREAS COMUNES, UBICADAS EN SUR 20 ENTRE RETORNO 5 Y RETORNO 6 DE SUR 20, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO MODULAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO PERMEABLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE PICNIC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PERIMETRAL, DEMOLICIÓN DE ASFALTO, CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA PARA VELARÍA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO, COLOCACIÓN DE VELARÍA.

19.- MODULO DEPORTIVO 09 UBICADO EN SUR 20 ESQUINA CON ORIENTE 239-B, AGRÍCOLA ORIENTAL.

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE CANCHA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO PERMEABLE, CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA PARA VELARÍA Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA VELARÍA, COLOCACIÓN DE VELARÍA.

20.- MODULO DEPORTIVO 11, UBICADO EN AVENIDA GIRASOLES N° 14 ENTRE CALLE TEPETATE, COLONIA INFONAVIT IZTACALCO.

RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE BASURA.

21.- MODULO DEPORTIVO 23, UBICADO EN CALLE UNO N° 39, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN.

DESVERBE, RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES.

22.- MODULO DEPORTIVO 13, UBICADO EN AVENIDA GIRASOLES ENTRE CALLE CORTEZA Y HOJA DE ÁRBOL, COLONIA INFONAVIT IZTACALCO.

RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES.

23.- MODULO DEPORTIVO 14, UBICADO EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO ENTRE CALLE BARRO NEGRO Y CALLE TEQUEZQUITTE, COLONIA INFONAVIT IZTACALCO

RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE BASURA.

24.- MODULO DEPORTIVO 17, UBICADO EN AVENIDA PLAYA ERIZO ESQUINA CON PLAYA MIRAMAR, BARRIO SANTIAGO SUR.

RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADORES, SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE BASURA.

25.- MODULO DEPORTIVO 21, UBICADO EN PROLONGACIÓN CANAL RÍO CHURUBUSCO, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADORES.

26.- MODULO DEPORTIVO 10, UBICADO ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y ORIENTE 253, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADORES, COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL RUSBULO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

- 27.- MODULO DEPORTIVO 06, UBICADO EN SUR 8 S/N ENTRE ORIENTE 233-A Y ORIENTE 233-B, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTABLES PARA BEBE Y BOTES DE BASURA.
 - 28.- MODULO DEPORTIVO 16, UBICADO EN ANDADOR 10 ENTRE ANDADOR 5 Y ANDADOR 6, COLONIA INPI PICOS.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA.
 - 29.- MODULO DEPORTIVO 10, UBICADO ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y ORIENTE 253, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADORES.
 - 30.- MODULO DEPORTIVO 29, UBICADO EN FEDERICO G. BATING ENTRE FEDERICO G. BATING Y RETORNO 1 DE ROBERTO KOCH, COLONIA AGRÍCOLA PANTITLÁN.
REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, REPARACIÓN DE EJERCITADORES Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA.
 - 31.- CONSULTORIOS, UBICADO EN COYUYA # 208 ENTRE TERRAPLÉN DE RIO FRIO Y VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD, COLONIA LA CRUZ COYUYA.
REHABILITACIÓN DE FACHADAS, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE LAMINA, REMODELACIÓN GENERAL DE ESPACIOS INTERIORES, SUSTITUCIÓN D INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIA E HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS DE REHABILITACIÓN FÍSICA CONSULTORIOS MÉDICOS Y DENTALES.
 - 32.- VIVEROS, UBICADO EN ORIENTE 257 ENTRE SUR 16 Y SUR 20, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL.
CONSTRUCCIÓN DE BARDADA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA SUSTRATOS, BODEGA, ALMACÉN Y CUARTO DE MAQUINAS, CONSTRUCCIONE DE MÓDULOS PARA INVERNADERO, SUSTITUCIÓN DE ANDADOR VEHICULAR DE CONCRETO ASFALTICO POR ADOQUÍN PERMEABLE, COLOCACIÓN DE SISTEM, DE RIEGO PARA MÓDULOS, CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN 4 MÓDULOS, CON LA INSTALACIÓN DE CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS CADA UN, Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADOR CENTRAL VEHICULAR, CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
 - 33.- BAÑOS, UBICADOS EN EDIFICIO SEDE DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN BRAMADERO.
RECUBRIMIENTO CERÁMICO EN PISOS Y MUROS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA, COLOCACIÓN DE MAMPARAS MODULARES DE ACERC INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE CHAPAS DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS PLAFONES, INSTALACIÓN DE RED VOZ Y DATOS, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN DE MUEBLES FIJOS.
- POBLACIÓN BENEFICIADA: 220,899 HABITANTES**
- IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 58,601,035.67**






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

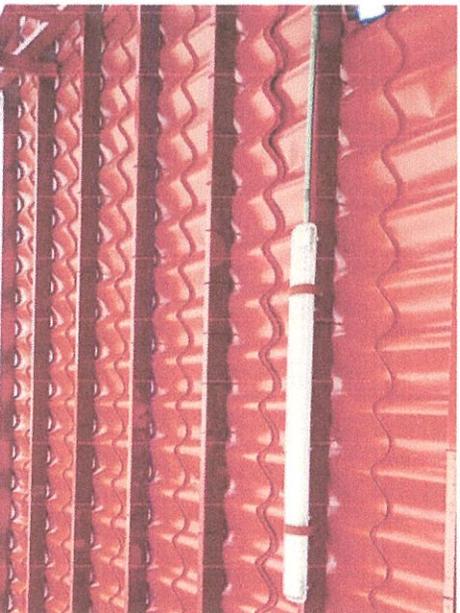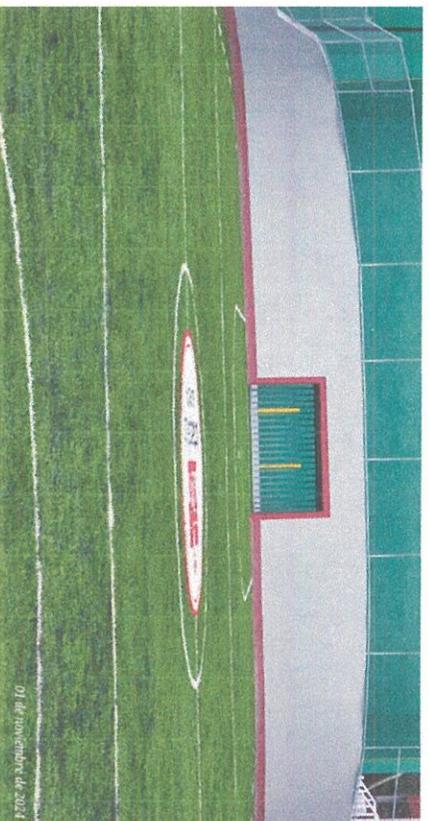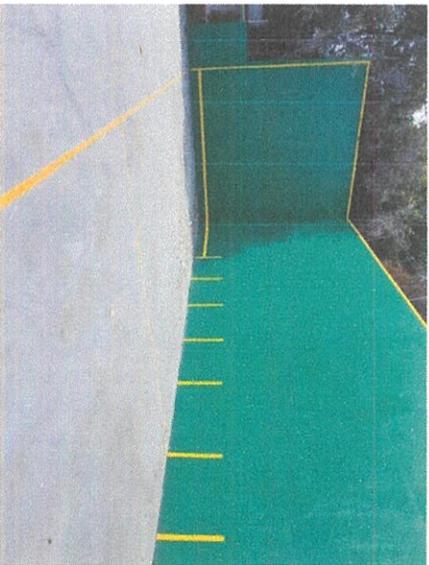






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL TURISMO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

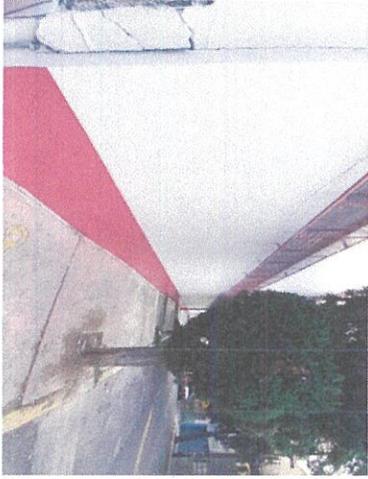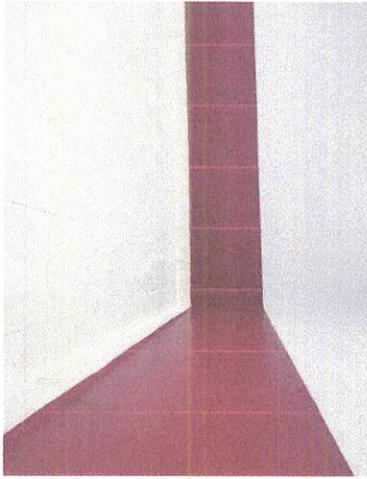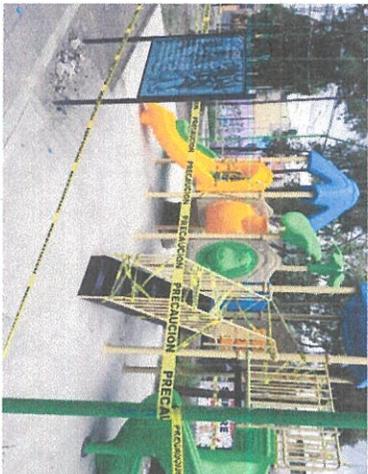



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**


**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS**



**JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL GUSTIBO**

TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

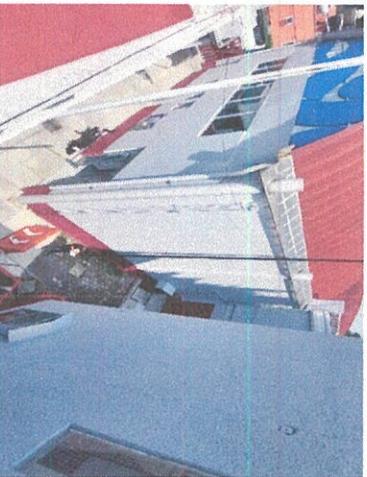



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL RUSTICO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL SUSEJO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

